

WI2022 MANAJEMEN PROYEK
SPRINT-1 EXECUTING

Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit
MaNPro



Dipersiapkan oleh:

Kelompok 07 Kelas 21

13524073 Keisha Rizka Syofyani

13524087 Muhammad Fakhry Zaki

13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

13524109 Helena Kristela Sarhawa

13524111 Reynard Anderson Wijaya

Tanggal pengumpulan: 5 Mei 2026 pukul 23.55

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132
2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I	
Sprint-1 Executing	5
1.1. Kanban Board	5
1. Tahap 1: Hari 1-2	5
2. Tahap 2: Hari 3-4	5
3. Tahap 3: Hari 5-6	6
4. Tahap 4: Hari 7-8	7
5. Tahap 5: Hari 9-10	8
1.2. Burndown Chart	10
1.3. Status Akhir Task Sprint 1	11

Daftar Tabel

Tabel 1.2.1 Rincian Progresi Burndown Chart Sprint 1	10
Tabel 1.3.1 Rincian Status Task pada Akhir Sprint 1	11

Daftar Gambar

Gambar 1.1.1 Kanban Board tahap 1	5
Gambar 1.1.2 Kanban Board tahap 2	6
Gambar 1.1.3 Kanban Board tahap 3	7
Gambar 1.1.4 Kanban Board tahap 4	8
Gambar 1.1.5 Kanban Board tahap 5	9
Gambar 1.2.1 Burndown Chart Sprint 1	10


BAB I

Sprint-1 Executing

1.1. Kanban Board

1. Tahap 1: Hari 1-2

Berikut *Kanban Board* untuk tahap 1.

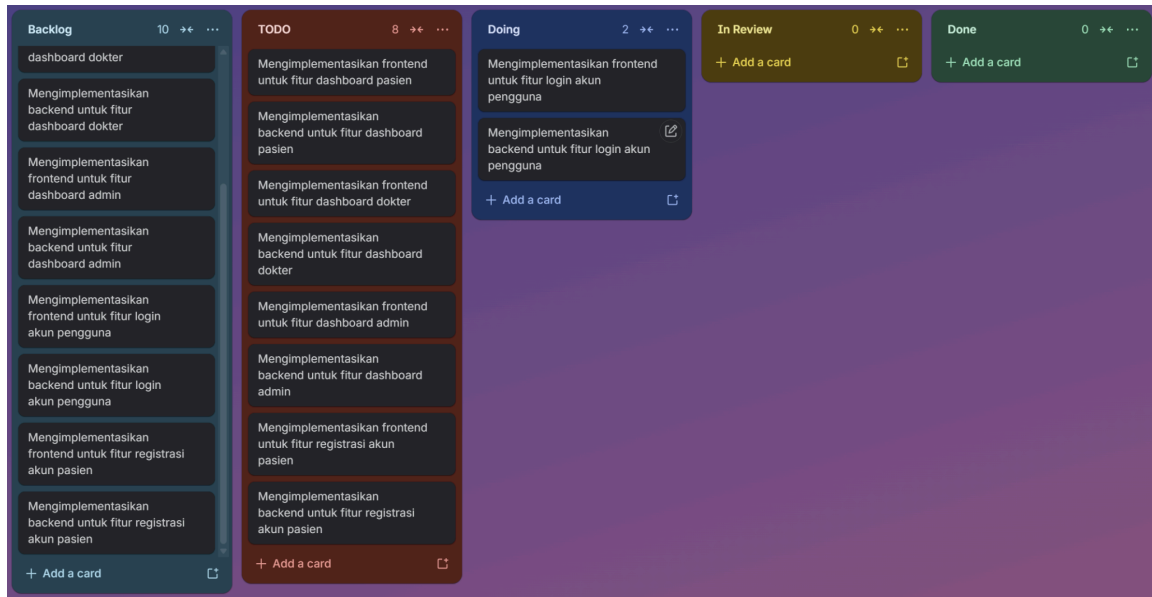

Gambar 1.1.1 Kanban Board tahap 1


Pada tahap pertama, task yang mulai dikerjakan adalah sebagai berikut.

- Mengimplementasikan frontend untuk fitur login akun pengguna
- Mengimplementasikan backend untuk fitur login akun pengguna

Pada tahap pertama, task yang mulai dikerjakan adalah implementasi frontend dan backend untuk fitur login akun pengguna. Fitur login diprioritaskan terlebih dahulu karena merupakan fitur utama sistem autentikasi yang dibutuhkan sebelum pengguna dapat mengakses dashboard pasien, dokter, maupun admin. Selain itu, penyelesaian fitur login lebih awal mempermudah proses pengujian dan integrasi fitur lain pada tahap berikutnya. Pada akhir hari kedua, kedua task telah selesai dikerjakan dan siap memasuki tahap review.

2. Tahap 2: Hari 3-4

Berikut *Kanban Board* untuk tahap 2.

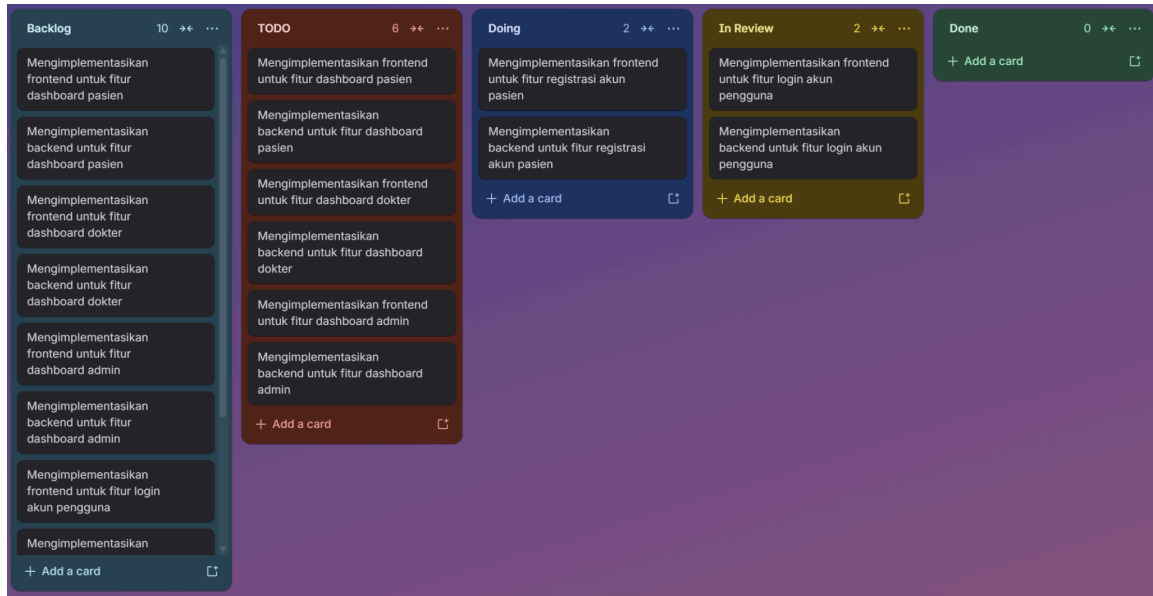

Gambar 1.1.2 Kanban Board tahap 2


Pada tahap kedua, dimulai task-task berikut.

- a. Mengimplementasikan frontend untuk fitur registrasi akun pasien
- b. Mengimplementasikan backend untuk fitur registrasi akun pasien

Pada tahap kedua, task yang mulai dikerjakan adalah implementasi frontend dan backend untuk fitur registrasi akun pasien. Fitur registrasi dipilih setelah login karena masih berada dalam modul autentikasi dan diperlukan agar pengguna baru dapat membuat akun sebelum menggunakan sistem. Penyelesaian fitur registrasi juga membantu menyiapkan alur penggunaan aplikasi secara lengkap, mulai dari pembuatan akun hingga proses login. Pada tahap ini, task login yang telah selesai sebelumnya memasuki proses review, sedangkan task registrasi diselesaikan pada akhir hari kedua.

3. Tahap 3: Hari 5-6

Berikut *Kanban Board* untuk tahap 3.

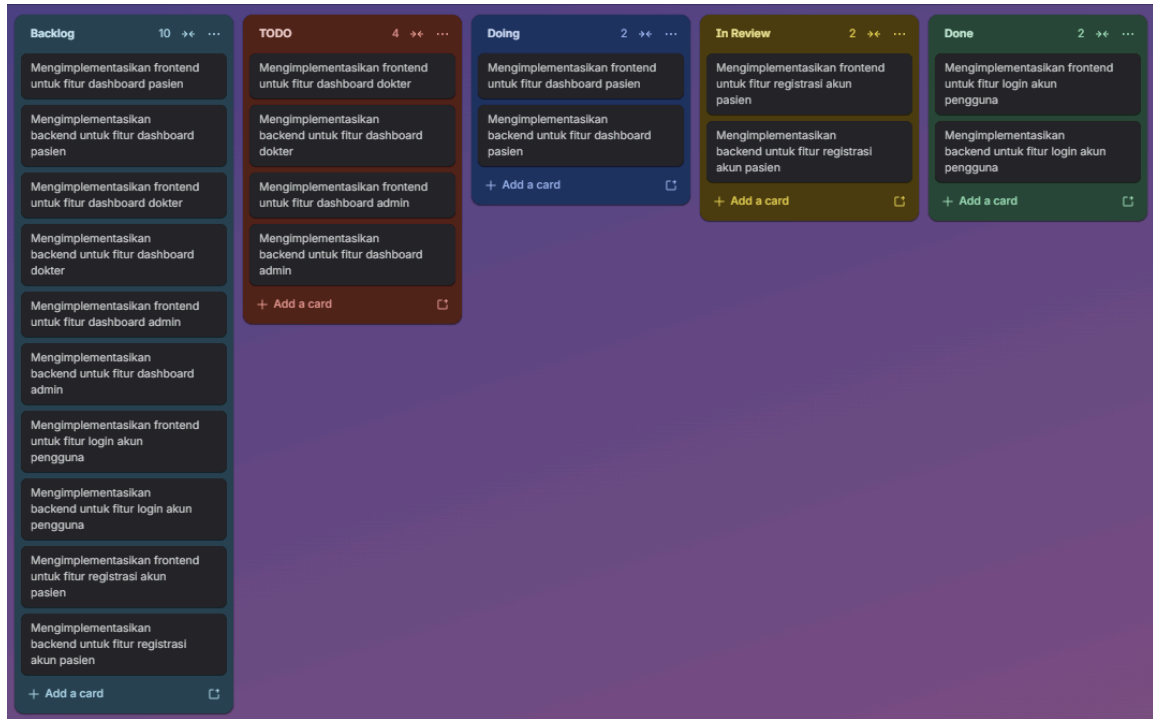

Gambar 1.1.3 Kanban Board tahap 3


Pada tahap ketiga, task-task berikut dimulai.

- Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard pasien
- Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard pasien

Pada tahap ketiga, task yang mulai dikerjakan yakni implementasi frontend dan backend untuk fitur dashboard pasien. Fitur dashboard pasien diprioritaskan terlebih dahulu karena fitur ini merupakan halaman utama yang akan diakses pasien setelah berhasil login sehingga penyelesaiannya yang lebih awal akan memudahkan proses pengujian alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Pada tahap ini, task registrasi yang telah selesai dikerjakan akan memasuki proses review. Pada akhir hari keenam, kedua task dashboard pasien telah selesai dikerjakan dan login sudah berpindah ke kolom Done.

4. Tahap 4: Hari 7-8

Berikut *Kanban Board* untuk tahap 4.

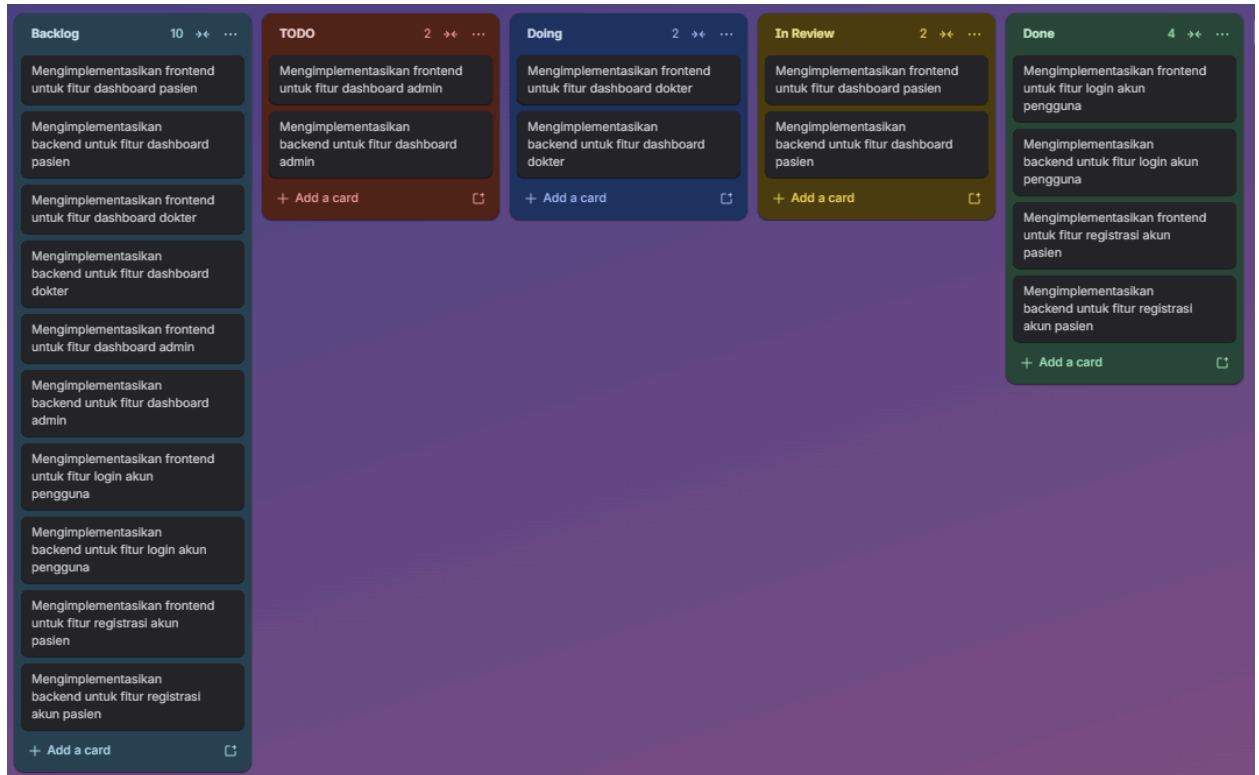

Gambar 1.1.4 Kanban Board tahap 4


Pada tahap keempat, task-task berikut dimulai.

- Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard dokter
- Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard dokter

Pada tahap keempat, task yang mulai dikerjakan yakni implementasi frontend dan backend untuk fitur dashboard dokter. Dashboard dokter dipilih setelah dashboard pasien karena keduanya memiliki struktur yang serupa namun menampilkan informasi yang berbeda sesuai peran pengguna, sehingga pengerjaan secara berurutan akan mempermudah pengembang dalam menjaga konsistensi antarmuka. Pada tahap ini, dashboard pasien yang telah selesai akan memasuki proses review, sementara registrasi berpindah ke kolom Done. Pada akhir hari kedelapan, kedua task dashboard dokter telah selesai dikerjakan.

5. Tahap 5: Hari 9-10

Berikut *Kanban Board* untuk tahap 5.

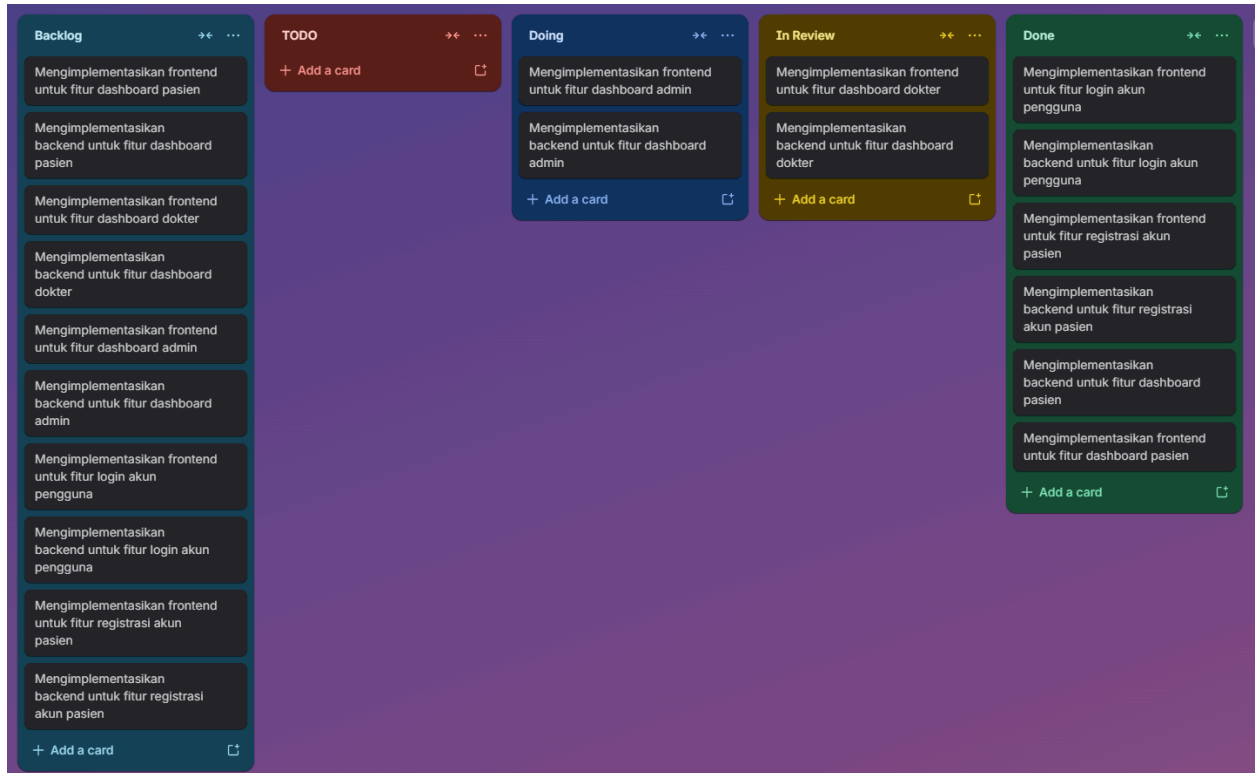

Gambar 1.1.5 Kanban Board tahap 5

Pada tahap kelima, task-task berikut dimulai.

- a. Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard admin
- b. Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard admin

Pada tahap kelima, task yang mulai dikerjakan adalah implementasi frontend dan backend untuk fitur dashboard admin. Dashboard admin dipilih untuk dikerjakan terakhir setelah dashboard pasien dan dokter dengan alasan karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara dashboard pasien atau dokter dengan dashboard admin. Dengan pertimbangan tersebut, diputuskanlah agar dashboard admin dikerjakan terakhir. Pada tahap ini, dashboard dokter yang telah selesai akan memasuki proses review, sementara dashboard pasien berpindah ke kolom Done. Pada akhir hari kedelapan, kedua task dashboard dokter telah selesai dikerjakan.

SB-01-08	ET-01-08	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB-01-09	ET-01-09	16	16	16	8	0	0	0	0	0	0	0
SB-01-10	ET-01-10	16	16	16	8	0	0	0	0	0	0	0

1.3. Status Akhir Task Sprint 1

Tabel 1.3.1 Rincian Status Task pada Akhir Sprint 1

ID Sprint Backlog	Task	Status
SB-01-01	Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard pasien	Done
SB-01-02	Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard pasien	Done
SB-01-03	Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard dokter	Done
SB-01-04	Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard dokter	Done
SB-01-05	Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard admin	Done
SB-01-06	Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard admin	Done
SB-01-07	Mengimplementasikan frontend untuk fitur login akun pengguna	Done
SB-01-08	Mengimplementasikan backend untuk fitur login akun pengguna	Done

SB-01-09	Mengimplementasikan frontend untuk fitur registrasi akun pasien	Done
SB-01-10	Mengimplementasikan backend untuk fitur registrasi akun pasien	Done
