

WI2022 MANAJEMEN PROYEK

Tugas Work Breakdown Structure

Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro

Disusun oleh:

Kelompok 07 Kelas 21

Keisha Rizka Syofyani	13524073
Muhammad Fakhry Zaki	13524087
Aurelia Jennifer Gunawan	13524089
Helena Kristela Sarhawa	13524109
Reynard Anderson Wijaya	13524111

Tanggal pengumpulan: Selasa, 31 Maret 2026 pukul 23.55

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JL. GANESA 10, BANDUNG 40132

2026

Daftar Isi

1	Deliverables Structure Chart	5
2	Model Proses Software Engineering: Waterfall Model	5
3	Work Breakdown Structure	7
3.1	Dekomposisi Utama Work Breakdown Structure	7
3.2	Work Breakdown Structure	7
1.	Initiating	7
2.	Planning	7
3.	Executing	7
4.	Controlling	9
5.	Closing	10
3.3	Kamus WBS	10

Daftar Tabel

Tabel 1. Kamus WBS


10

Daftar Gambar

Gambar 1. Deliverables structure chart

5

1 Deliverables Structure Chart

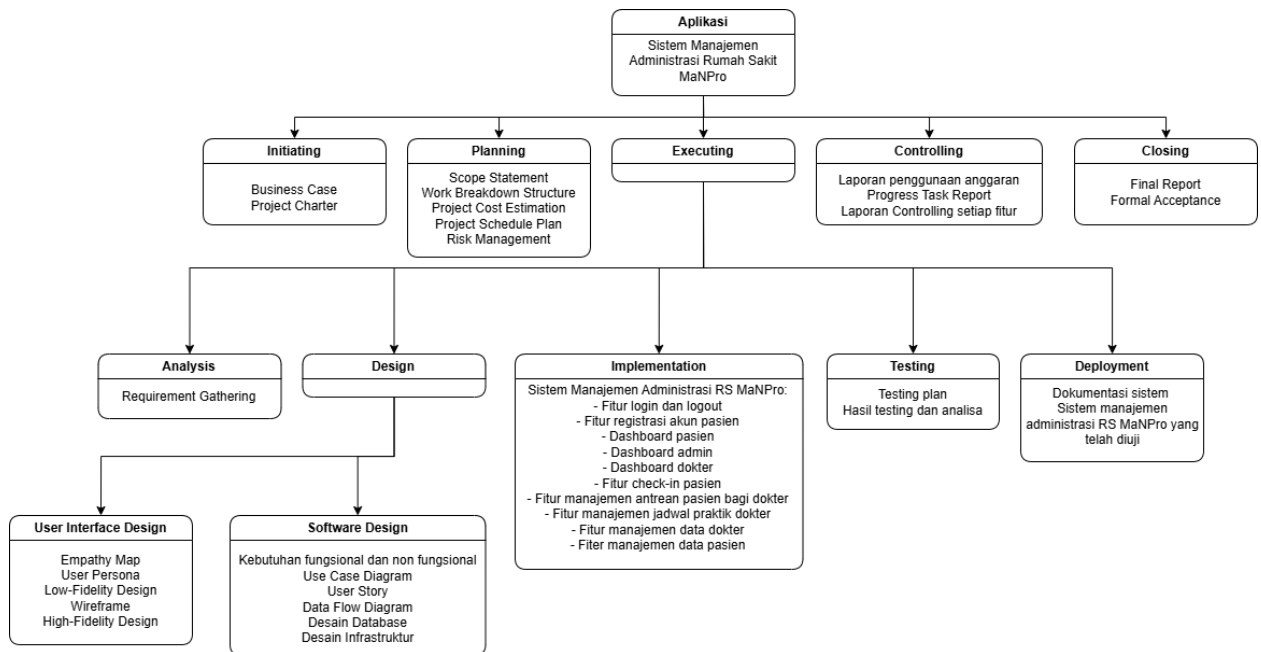

Gambar 1. Deliverables structure chart

Gambar di atas merupakan deliverables structure chart (DSC) yang diperlukan untuk proyek aplikasi. Deliverables structure chart merupakan diagram yang memvisualisasikan setiap deliverables yang dihasilkan pada setiap proses dalam proyek pengembangan aplikasi. Setiap kotak pada diagram merepresentasikan deliverables yang harus dihasilkan pada masing-masing tahapan proyek. Deliverables structure chart berperan dalam membantu tim memahami alur pekerjaan yang harus dilakukan dan memberikan gambaran mengenai *expected output* pada setiap tahap pengerjaan proyek.

Kotak paling atas menunjukkan hasil akhir dari keseluruhan proyek, yaitu aplikasi yang telah selesai dikembangkan. Dari kotak utama tersebut, dilakukan dekomposisi menjadi lima tahap, yaitu initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Tahap executing kemudian didekomposisi menjadi analysis, design, construction, integrating, testing, dan deployment. Selain itu, tahap design didekomposisi menjadi user interface design dan software design.

2 Model Proses Software Engineering: Waterfall Model

Proyek pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro memiliki cakupan dan kebutuhan yang telah didefinisikan dengan cukup jelas, seperti yang dijelaskan pada Business Case. Oleh karena itu, penggunaan waterfall model dinilai sesuai karena memungkinkan setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu,

proyek ini melibatkan berbagai modul yang saling terhubung, seperti modul manajemen antrean, manajemen jadwal dokter, dan manajemen data pasien. Kondisi ini menuntut perencanaan yang matang di awal proyek untuk meminimalisir perubahan di tengah proses pengembangan. Dengan pendekatan Waterfall, setiap deliverable pada masing-masing tahap dapat dipastikan telah sesuai dengan kebutuhan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

Waterfall model terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu requirement analysis, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Model ini bersifat linear dan sistematis. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Penjelasan masing-masing tahapan pada proyek pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Requirement Analysis

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari stakeholder, seperti pihak rumah sakit, dokter, admin, dan pasien. Aktivitas pada tahap ini mencakup definisi user requirement, deskripsi dan kebutuhan sistem, dan karakteristik pengguna. Fitur-fitur utama yang dianalisis meliputi manajemen antrean pasien, manajemen jadwal praktik dokter, sistem login dan registrasi pasien, dan manajemen data pasien dan dokter.

b. Design

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi, tahap desain dilakukan untuk merancang solusi teknis dari sistem. Tahap ini mencakup perancangan arsitektur sistem, desain database dan desain antarmuka pengguna. Aktivitas desain meliputi pembuatan use case diagram, data flow diagram, user story, user persona, dan prototype. Hasil dari tahap desain adalah blueprint atau rancangan teknis yang akan menjadi acuan dalam tahap implementasi.

c. Implementation

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Implementasi dilakukan untuk berbagai fitur utama, seperti dashboard setiap peran, fitur login dan registrasi pasien, fitur manajemen antrean pasien, fitur manajemen jadwal praktik dokter, dan fitur manajemen data pasien dan dokter. Selain itu, dilakukan progress tracking untuk memastikan setiap fitur dikembangkan sesuai rencana. Hasil dari tahap ini adalah sistem dengan fitur yang telah terimplementasi dan terintegrasi.

d. Testing

Tahap testing dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan. Pengujian meliputi feature testing,

end-to-end testing, dan user acceptance testing. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi bug, memastikan setiap fitur terintegrasi dengan baik, dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, pada tahap testing akan dilakukan dokumentasi hasil pengujian sebagai bahan evaluasi.

e. Deployment

Setelah sistem diuji, tahap deployment dilakukan. Pada tahap deployment, dilakukan penyusunan dokumentasi perangkat lunak dan proses deployment. Proses ini mencakup konfigurasi sistem, pengaturan jaringan, dan memastikan sistem beroperasi dengan stabil. Proses ini mencakup pengelolaan database dan pengaturan keamanan untuk melindungi data pengguna.

3 Work Breakdown Structure

3.1 Dekomposisi Utama Work Breakdown Structure

Pendekatan yang dilakukan dalam proyek ini menggunakan *Management Process Group*. Melalui pendekatan ini, diharapkan proyek dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang sudah direncanakan. Pendekatan ini mencakup lima proses utama, yaitu *Initiating*, *Planning*, *Executing*, *Controlling*, dan *Closing*.

3.2 Work Breakdown Structure

1. Initiating

- 1.1 Menentukan project manager
- 1.2 Membentuk tim proyek
- 1.3 Merancang Business Case
- 1.4 Merancang Project Charter

2. Planning

- 2.1 Merancang Scope Statement
- 2.2 Membuat Work Breakdown Structure
- 2.3 Membuat project schedule dan alokasi sumber daya
- 2.4 Membuat project cost estimation
- 2.5 Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko

3. Executing

- 3.1 Melakukan requirement gathering
 - 3.1.1 Mendefinisikan *user requirement*

- 3.1.2 Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem
- 3.1.3 Mendefinisikan karakteristik pengguna
- 3.2 Membuat desain perangkat lunak
 - 3.2.1 Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)
 - 3.2.2 Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak
 - 3.2.3 Mendefinisikan *user story*
 - 3.2.4 Mendefinisikan *user persona*
 - 3.2.5 Membuat desain basis data perangkat lunak
 - 3.2.6 Mendefinisikan *use case diagram*
 - 3.2.7 Membuat data flow diagram
 - 3.2.8 Mempersiapkan infrastruktur sistem
 - 3.2.9 Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak
 - 3.2.10 Membuat low-fidelity prototype
 - 3.2.11 Membuat high-fidelity prototype
- 3.3 Mengimplementasikan desain perangkat lunak
 - 3.3.1 Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien
 - 3.3.2 Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien
 - 3.3.3 Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin
 - 3.3.4 Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin
 - 3.3.5 Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter
 - 3.3.6 Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter
 - 3.3.7 Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna
 - 3.3.8 Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna
 - 3.3.9 Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien
 - 3.3.10 Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien
 - 3.3.11 Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien
 - 3.3.12 Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien
 - 3.3.13 Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien
 - 3.3.14 Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien
 - 3.3.15 Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter
 - 3.3.16 Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter
 - 3.3.17 Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter
 - 3.3.18 Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter
 - 3.3.19 Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien

- 3.3.20 Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien
- 3.3.21 Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter
- 3.3.22 Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter
- 3.4 Melakukan pengujian perangkat lunak
 - 3.4.1 Feature Testing
 - 3.4.2 *End-to-End* Testing
 - 3.4.3 User Acceptance Testing (UAT)
 - 3.4.4 Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian
- 3.5 Melakukan deployment perangkat lunak
 - 3.5.1 Penyusunan dokumentasi perangkat lunak
 - 3.5.2 Deployment perangkat lunak

4. Controlling

- 4.1 Mengevaluasi proses inisiasi proyek
 - 4.1.1 Mengevaluasi hasil business case
 - 4.1.2 Mengevaluasi hasil project charter
- 4.2 Mengevaluasi proses perencanaan proyek
 - 4.2.1 Mengevaluasi scope statement
 - 4.2.2 Mengevaluasi work breakdown structure
 - 4.2.3 Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya
 - 4.2.4 Mengevaluasi project cost estimation
 - 4.2.5 Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko
- 4.3 Mengevaluasi desain perangkat lunak
 - 4.3.1 Mengevaluasi hasil rancangan *user requirement*
 - 4.3.2 Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem
 - 4.3.3 Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna
 - 4.3.4 Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)
 - 4.3.5 Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak
 - 4.3.6 Mengevaluasi hasil rancangan user story
 - 4.3.7 Mengevaluasi hasil rancangan user persona
 - 4.3.8 Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak
 - 4.3.9 Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram
 - 4.3.10 Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram
 - 4.3.11 Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem
 - 4.3.12 Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak
 - 4.3.13 Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype
 - 4.3.14 Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype
- 4.4 Melakukan pemantauan progress fitur-fitur perangkat lunak

- 4.4.1 Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien
- 4.4.2 Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin
- 4.4.3 Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter
- 4.4.4 Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna
- 4.4.5 Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien
- 4.4.6 Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien
- 4.4.7 Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien
- 4.4.8 Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter
- 4.4.9 Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter
- 4.4.10 Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien
- 4.4.11 Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter
- 4.5 Memastikan kesesuaian hasil pengujian perangkat lunak
 - 4.5.1 Evaluasi hasil Feature Testing
 - 4.5.2 Evaluasi hasil *End-to-End* Testing
 - 4.5.3 Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)
- 4.6 Melakukan pemantauan tahap deployment perangkat lunak
 - 4.6.1 Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak
 - 4.6.2 Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik

5. Closing

- 5.1 Membuat *final report*
- 5.2 Melakukan *final acceptance*

3.3 Kamus WBS

Tabel 1. Kamus WBS

Nomor Task	Nama Singkat Task	Hasil/Deliverables	Sumber Daya	Durasi (hari)	Predecessors
1.1	Menentukan project manager	Memilih seorang project manager untuk proyek RumahSakitMaNPro	-	1	-
1.2	Membentuk tim proyek	Membentuk sebuah tim yang sesuai untuk proyek RumahSakitMaNPro	1 orang PM	1	1.1
1.3	Merancang Business Case	Dokumen Business	4 orang	3	1.2

		Case			
1.4	Merancang Project Charter	Dokumen Project Charter	1 orang PM	1	1.2
2.1	Merancang Scope Statement	Dokumen Scope Statement	2 orang	3	-
2.2	Membuat Work Breakdown Structure	Dokumen Work Breakdown Structure	3 orang	3	-
2.3	Membuat project schedule dan alokasi sumber daya	Dokumen project schedule plan	1 orang PM	3	2.2
2.4	Membuat project cost estimation	Dokumen project cost estimation	3 orang	3	2.2 2.3
2.5	Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko	Dokumen risk mitigation	1 orang PM	3	2.3
3.1.1	Mendefinisikan user requirement	Daftar kebutuhan dan hasil requirement gathering	1 orang PM	2	-
3.1.2	Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem	Dokumentasi deskripsi dan kebutuhan sistem	3 orang	2	-
3.1.3	Mendefinisikan karakteristik pengguna	Karakteristik pengguna yang menggunakan aplikasi	1 orang UI/UX Designer	4	-
3.2.1	Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak	1 orang PM	2	3.1.2
3.2.2	Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Dokumen deskripsi perencanaan perangkat lunak	1 orang PM	2	3.2.1
3.2.3	Mendefinisikan user story	User story yang sudah terdefinisi	1 orang UI/UX Designer	1	3.1.3
3.2.4	Mendefinisikan user persona	User persona yang sudah terdefinisi	1 orang UI/UX Designer	1	3.1.3
3.2.5	Membuat desain basis data perangkat lunak	Desain basis data perangkat lunak dan ERD (Entity Relationship)	1 orang Backend Developer	3	3.2.2

		Diagram)			
3.2.6	Mendefinisikan use case diagram	Dokumen use case diagram	1 orang PM	1	3.2.1
3.2.7	Membuat data flow diagram	Dokumen data flow diagram	1 orang PM	1	3.2.5
3.2.8	Mempersiapkan infrastruktur sistem	Dokumen infrastruktur sistem	1 orang Backend Developer	3	3.2.5 3.2.6 3.2.7
3.2.9	Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak	CI/CD pipeline	1 orang PM	2	3.2.2
3.2.10	Membuat low-fidelity prototype	Prototype low-fidelity dari aplikasi di figma	1 orang UI/UX Designer	3	3.2.3 3.2.4
3.2.11	Membuat high-fidelity prototype	Prototype high-fidelity dari aplikasi di figma	1 orang UI/UX Designer	5	3.2.10
3.3.1	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien	Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard pasien	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.2	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien	Fungsionalitas spesifik fitur dashboard pasien	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.3	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin	Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard admin	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.4	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin	Fungsionalitas spesifik fitur dashboard admin	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.5	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter	Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard dokter	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.6	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter	Fungsionalitas spesifik fitur dashboard dokter	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.7	Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna	Seluruh komponen front end untuk fitur Login akun pengguna	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11

3.3.8	Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna	Fungsionalitas spesifik fitur Login akun pengguna	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.9	Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien	Seluruh komponen front end untuk fitur Registrasi akun pasien	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.10	Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien	Fungsionalitas spesifik fitur Registrasi akun pasien	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.11	Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Seluruh komponen front end untuk fitur antrean pasien	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.12	Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Fungsionalitas spesifik fitur Pendaftaran antrean pasien	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.13	Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien	Seluruh komponen front end untuk fitur Check-in pasien	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.14	Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien	Fungsionalitas spesifik fitur Check-in pasien	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.15	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.16	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.17	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen jadwal praktik dokter	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.18	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen jadwal praktik dokter	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.19	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen	Seluruh komponen front end untuk fitur	1 orang Frontend	2	3.2.11

	data pasien	Manajemen data pasien	Developer		
3.3.20	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data pasien	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.3.21	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data dokter	1 orang Frontend Developer	2	3.2.11
3.3.22	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data dokter	1 orang Backend Developer	2	3.2.2 3.2.5
3.4.1	Feature Testing	Perangkat lunak yang sudah melalui Feature Testing	1 orang QA	3	3.3
3.4.2	End-to-End Testing	Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui End-to-End testing	1 orang QA	3	3.4.1
3.4.3	User Acceptance Testing (UAT)	Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui UAT	1 orang QA dan stakeholder	2	-
3.4.4	Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	Dokumen hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak	1 orang PM	1	-
3.5.1	Penyusunan dokumentasi perangkat lunak	Dokumentasi proyek secara keseluruhan	1 orang Backend Developer dan 1 orang Frontend Developer	2	-
3.5.2	Deployment perangkat lunak	Perangkat lunak yang siap digunakan	1 orang Backend Developer	1	3.5.1
4.1.1	Mengevaluasi hasil business case	-	PM dan stakeholder	3	1.3

4.1.2	Mengevaluasi hasil project charter	-	PM dan stakeholder	1	1.4
4.2.1	Mengevaluasi scope statement	-	PM dan stakeholder	3	2.1
4.2.2	Mengevaluasi work breakdown structure	-	PM dan stakeholder	3	2.2
4.2.3	Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya	-	PM dan stakeholder	3	2.3
4.2.4	Mengevaluasi project cost estimation	-	PM dan stakeholder	3	2.4
4.2.5	Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko	-	PM dan stakeholder	3	2.5
4.3.1	Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>		PM dan stakeholder	2	3.1.1
4.3.2	Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem		PM dan stakeholder	2	3.1.2
4.3.3	Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna		PM dan stakeholder	4	3.1.3
4.3.4	Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	-	PM dan QA	2	3.2.1
4.3.5	Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	-	PM dan QA	2	3.2.2
4.3.6	Mengevaluasi hasil rancangan user story	-	PM dan QA	1	3.2.3
4.3.7	Mengevaluasi hasil rancangan user persona	-	PM dan QA	1	3.2.4
4.3.8	Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat	-	PM dan QA	3	3.2.5

	lunak				
4.3.9	Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram	-	PM dan QA	1	3.2.6
4.3.10	Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram	-	PM dan QA	1	3.2.7
4.3.11	Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem	-	PM dan QA	3	3.2.8
4.3.12	Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	-	PM dan QA	2	3.2.9
4.3.13	Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype	-	PM dan QA	3	3.2.10
4.3.14	Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype	-	PM dan QA	5	3.2.11
4.4.1	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien	-	PM dan QA	2	3.3.1 3.3.2
4.4.2	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin	-	PM dan QA	2	3.3.3 3.3.4
4.4.3	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter	-	PM dan QA	2	3.3.5 3.3.6
4.4.4	Melakukan pemantauan progress fitur login akun pengguna	-	PM dan QA	2	3.3.7 3.3.8
4.4.5	Melakukan pemantauan progress fitur registrasi akun pasien	-	PM dan QA	2	3.3.9 3.3.10
4.4.6	Melakukan pemantauan progress fitur pendaftaran antrean pasien	-	PM dan QA	2	3.3.11 3.3.12
4.4.7	Melakukan pemantauan progress fitur check-in pasien	-	PM dan QA	2	3.3.13 3.3.14
4.4.8	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	-	PM dan QA	2	3.3.15 3.3.16

4.4.9	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen jadwal praktik dokter	-	PM dan QA	2	3.3.17 3.3.18
4.4.10	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data pasien	-	PM dan QA	2	3.3.19 3.3.20
4.4.11	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data dokter	-	PM dan QA	2	3.3.21 3.3.22
4.5.1	Evaluasi hasil Feature Testing	-	PM dan QA	3	3.4.1
4.5.2	Evaluasi hasil End-to-End Testing	-	PM dan QA	3	3.4.2
4.5.3	Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)	-	PM dan QA	2	3.4.3
4.6.1	Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	-	PM dan QA	1	3.5.1
4.6.2	Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	-	PM dan QA	2	3.5.2
5.1	Membuat final report	Dokumen final report	1 orang PM	10	3.5.2 4.6.2
5.2	Melakukan final acceptance	Dokumen final acceptance	1 orang PM	2	5.1
