

WI2022 Manajemen Proyek

Project Planning

[Konsep Dasar Perencanaan](#)

[Project Planning](#)

[Time Allocation by Phase](#)

[Software Project Management Plan](#)

[Overview](#)

[Project Organization](#)

[Management Approaches](#)

[Technical Approaches](#)

[Project Schedule Information](#)

[Budget Information](#)

Konsep Dasar Perencanaan

- Perencanaan adalah **fungsi dasar** dalam **manajemen** yang melibatkan **penetapan tujuan** dan **cara mencapainya**, serta mempersiapkan **tindakan** yang akan diambil.
- **Karakteristik planning:**
 - **Fungsi utama:** Perencanaan adalah fungsi dasar dan utama dalam manajemen yang menjadi landasan bagi fungsi lainnya
 - **Proses intelektual:** Perencanaan melibatkan proses intelektual yang membutuhkan kecerdasan, imajinasi, dan pemikiran kreatif
 - **Berorientasi pada hasil:** Perencanaan dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat dan ekonomis
 - **Berorientasi pada masa depan:** Perencanaan selalu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan dan berdasarkan perkiraan
 - **Proses berkelanjutan:** Perencanaan adalah fungsi yang terus-menerus karena lingkungan bisnis yang dinamis
 - **Menyeluruh:** Perencanaan diperlukan di semua tingkat manajemen dan departemen perusahaan
 - **Penghubung masa lalu, sekarang, dan masa depan:** Perencanaan selalu untuk masa depan tetapi didasarkan pada pengalaman masa lalu
 - **Melibatkan pilihan dan pengambilan keputusan:** Perencanaan melibatkan pilihan di antara berbagai alternatif dan pengambilan keputusan untuk memilih opsi terbaik
 - **Dirancang untuk efisiensi:** Perencanaan bertujuan untuk mencapai tujuan dengan biaya seminimal mungkin dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal
 - **Dasar pengendalian:** Perencanaan dan pengendalian saling terkait, di mana perencanaan mendahului pengendalian dan pengendalian mengikuti perencanaan

Project Planning

Time Allocation by Phase

Remember the 40-20-40 rule: Specification-Implementation-Test

	Planning	Code & Unit Test	Integration & Test
Commercial DP	25%	40%	35%
Internet Systems	55%	15%	30%
Real-time Systems	35%	25%	40%
Defense Systems	40%	20%	40%


Activity	Small Project (2.5K LOC)	Large Project (500K LOC)
Analysis	10%	30%
Design	20%	20%
Code	25%	10%
Unit Test	20%	5%
Integration	15%	20%
System test	10%	15%

Karena perubahan kondisi dalam proyek dan organisasi, project plan dapat direvisi di tiap fase dalam siklus proyek. Dokumen planning meliputi:

1. Team contract
 - a. Berisi pernyataan umum bagaimana setiap anggota tim harus bersikap dalam menjalankan tugas/pekerjaannya:
 - i. code of conduct
 - ii. participation
 - iii. communication
 - iv. problem solving
 - v. meeting guidelines
2. Project scope statement

Mencakup informasi:

- a. Project title
 - b. Date & prepared by
 - c. Project justification
 - d. Product characteristics & requirements
 - e. Summary of project deliverables (Project management-related deliverables and product-related deliverables)
 - f. Project success criteria
3. Work breakdown structure (WBS)

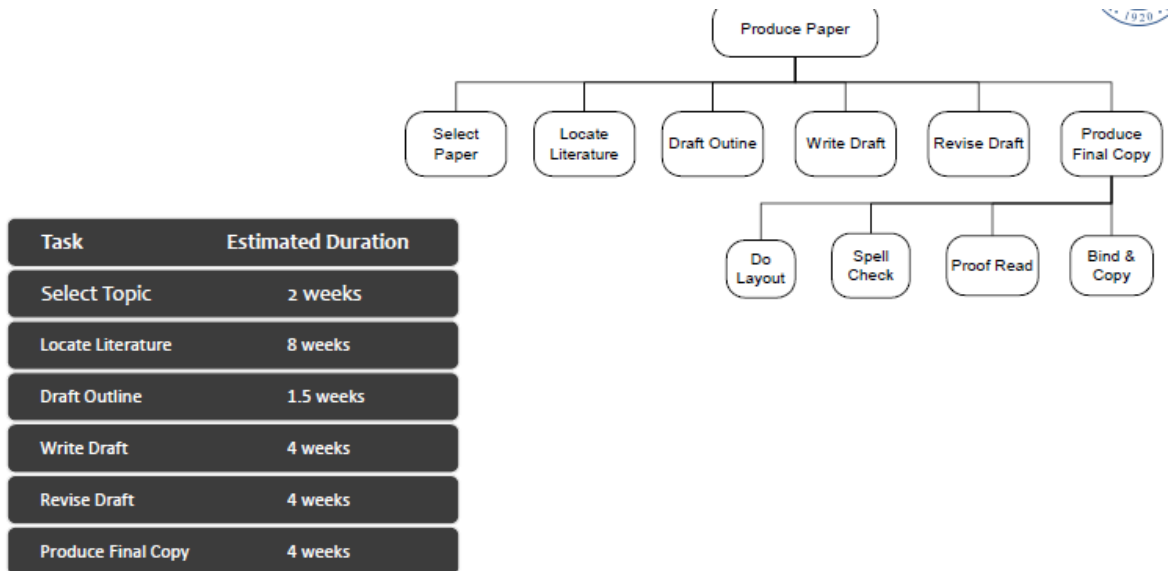

4. Project schedule
5. Project cost estimate
6. List of prioritize risks

Contoh List of Prioritized Risks

Masukan dari konsultan internal yg tidak mencukupi

Masukan dari client representatives yg tidak mencukupi

Keamanan sistem baru

Outsourcing/pembelian fitur-fitur retrieval artikel dan 'Tanyakan pada Ahlinya'

Outsourcing/pembelian pemrosesan transaksi pembayaran online

Pengorganisasian template dan contoh yg useful fashion

Penyediaan fitur pencarian yg efisien

Mendapatkan umpan balik yg bagus dari para konsultan senior

Promosi sistem baru yg efektif


Merealisasikan manfaat sistem baru dalam satu tahun



Untuk proyek yang besar diperlukan juga:

- Project organization charts
- Formal communications management plan
- Quality management plan
- Detailed cost estimates
- Procurement plan

Hubungan proses-proses di antara **Planning Processes**:

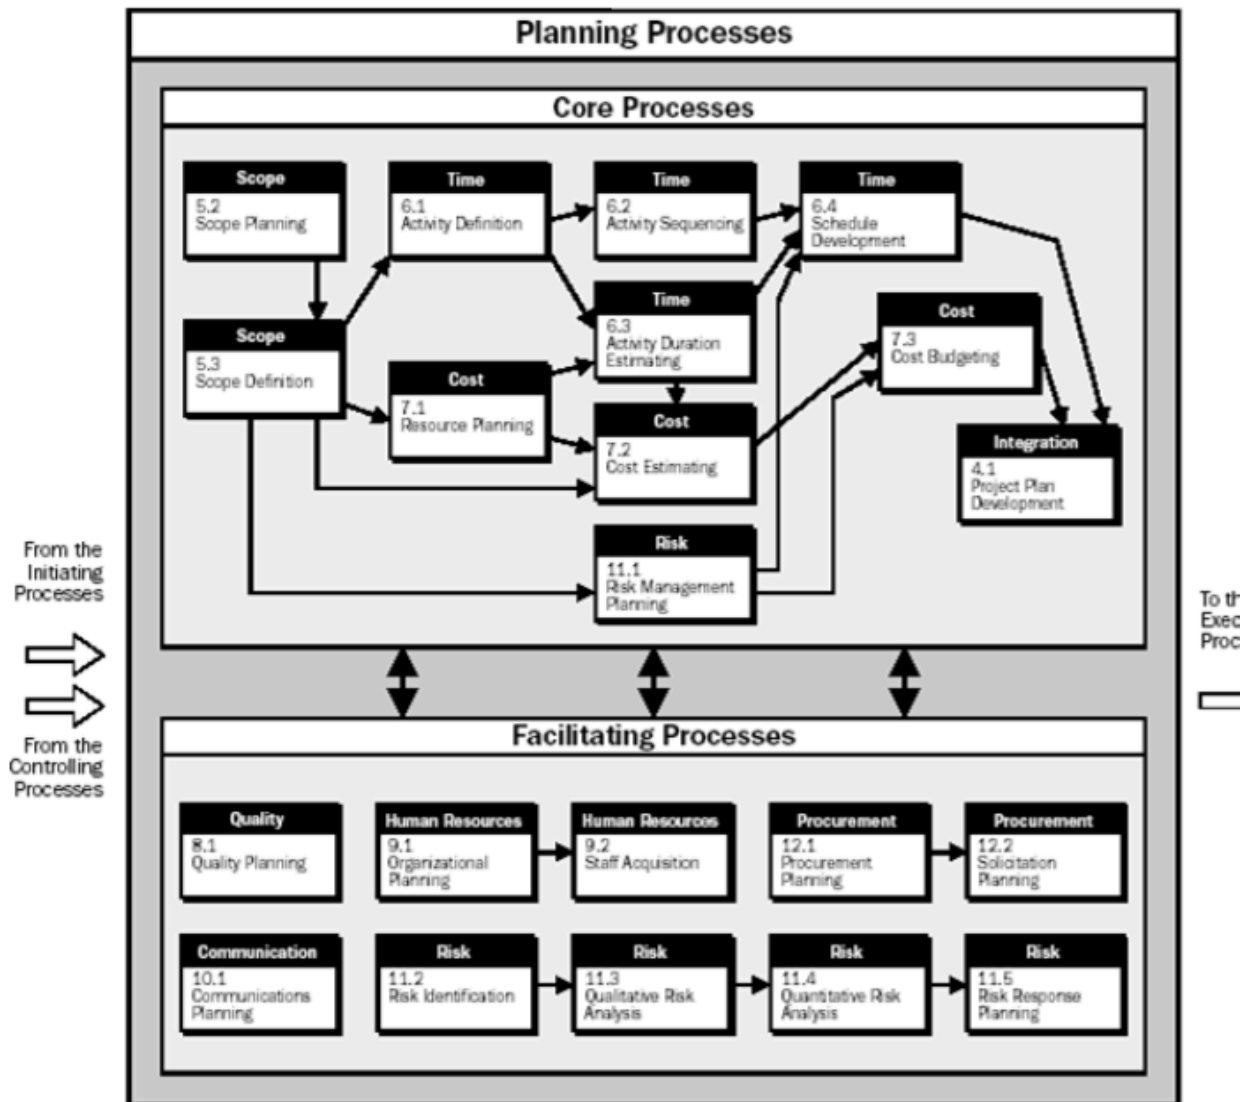

Software Project Management Plan

Overview

1. Nama proyek

2. Penjelasan singkat tentang proyek dan kebutuhan yang ditangani
3. Nama sponsor
4. Nama-nama manajer proyek dan anggota tim kunci
5. Hasil proyek
6. Daftar bahan referensi penting
7. Daftar definisi dan akronim

Project Organization

1. Bagan organisasi
2. Tanggung jawab proyek
3. Informasi lainnya terkait organisasi atau proses

Management Approaches

1. Tujuan manajemen
2. Kontrol proyek
3. Manajemen risiko
4. Staf proyek
5. Proses teknis

Technical Approaches

1. Paket pekerjaan utama
2. Hasil utama
3. Informasi lainnya terkait teknis pekerjaan

Project Schedule Information

1. Jadwal ringkas
2. Jadwal rinci
3. Informasi lainnya terkait jadwal

Budget Information

1. Anggaran ringkas
2. Anggaran rinci
3. Informasi lainnya terkait anggaran
