

WI2022 Manajemen Proyek

Project Scope Management

[Project Scope Management](#)

[5 Proses Utama dalam Project Scope Management](#)

[1. Plan Scope Management](#)

[2. Collect Requirement](#)

[3. Define Scope](#)

[4. Create WBS](#)


[Pendekatan dalam Penyusunan WBS](#)

[5. Validate Scope](#)

[6. Control Scope](#)

Project Scope Management

Proses utama dalam Project Scope Management:

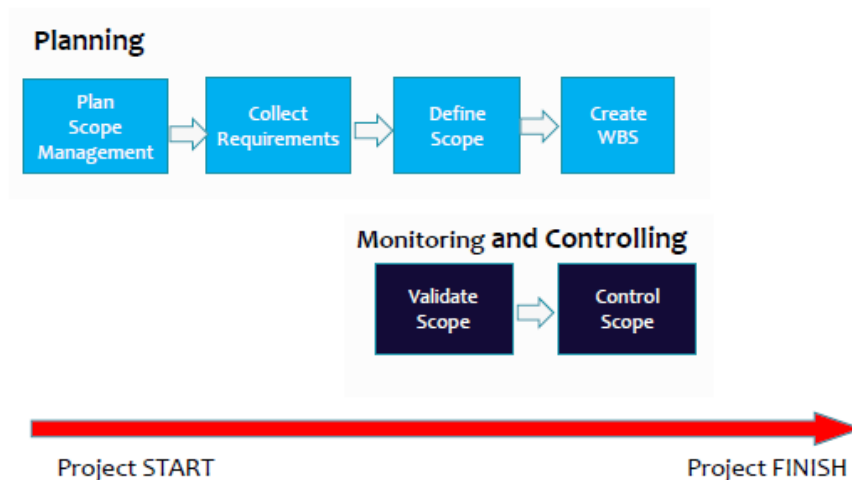

- Project scope (lingkup proyek) adalah semua pekerjaan yang melibatkan proses pembuatan produk untuk sebuah project.
- Dalam project scope management, terdapat sebuah proses yang mendefinisikan mana saja yang dimasukkan ke dalam proyek tersebut, dana mana saja yang tidak.
- Elemen dari project scope management yang merupakan faktor keberhasilan proyek:
 - keterlibatan user
 - objektif bisnis yang jelas
 - scope yang sesuai
 - requirement dasar yang tegas
- Scope mengacu pada **seluruh pekerjaan** untuk menghasilkan produk dan **proses-proses** yang digunakan untuk menghasilkannya
- Deliverable mendeskripsikan produk yang diproduksi sebagai bagian dari proyek

5 Proses Utama dalam Project Scope Management

1. Plan Scope Management

- Menentukan bagaimana scope akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan
- **Input utama:**
 - Project charter
 - Preliminary scope statement
 - Project management plan

- Requirements Documentation
 - mendokumentasi bagaimana project requirements akan dianalisis, didokumentasikan, dan dikelola
 - requirements management plan mencakup informasi:
 - bagaimana merencanakan, melacak, dan melaporkan kegiatan-kegiatan requirements
 - bagaimana melakukan aktivitas configuration management
 - bagaimana memprioritaskan requirements
 - bagaimana cara menggunakan product metrics
 - bagaimana melacak dan menangkap atribut requirements
- **Output:** Project Scope Management Plan yang akan berisi deskripsi tentang bagaimana tim akan:
 - Mempersiapkan project scope statement
 - Membuat WBS
 - Memverifikasi kelengkapan deliverables
 - Mengendalikan permintaan perubahan project scope

Template of Requirements Management Plan (example)

REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN	
Project Title: _____ Date: _____	Metrics
Collection	
Analysis	Traceability Structure
Categories	Tracking
Documentation	Reporting
Prioritization	Validation
	Configuration Management

Template of Requirements Documentation (example)

REQUIREMENTS DOCUMENTATION						
Project Title: _____			Date Prepared: _____			
ID	Requirement	Stakeholder	Category	Priority	Acceptance Criteria	Validation Method

2. Collect Requirement

- Mendefinisikan dan mencatat: fitur dan fungsi dari produk. Proses yang akan dilakukan untuk mengembangkan produk
- Dapat dilakukan melalui
 - Interview

- Focus Group Discussion (FGD)
- Kuesioner
- Survey
- Observasi
- Prototyping (membuat context diagram, use case)
- Benchmarking
- Aktivitas untuk document requirements:
 - Review project charter
 - temukan high level requirements
 - temukan scope and requirements management plan
 - Review daftar stakeholder
 - ensure them to say something for their requirements
 - Analisis requirements (functional & non-functional)
 - Buat requirements traceability matrix
- **Output:** Dokumentasi kebutuhan dan matrix traceability kebutuhan

Template of Requirements Traceability Matrix (example)

REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX								
Project Title: _____					Date Prepared: _____			
Requirement Information					Relationship Traceability			
ID	Requirement	Priority	Category	Source	Objective	WBS Deliverable	Metric	Validation

3. Define Scope

- Memformalkan diterimanya project scope dengan menentukan informasi tentang scope dan jika ada perubahan apa yang akan disetujui → penting

untuk keberhasilan proyek karena akan meningkatkan akurasi time, cost, dan estimasi resource

- Definisi scope juga akan menjadi **baseline** untuk pengukuran performance dan pengendalian proyek, serta membantu mengkomunikasikan tanggung jawab kerja yang **jelas**
- Meliputi:
 - penentuan produk yang akan dihasilkan
 - penentuan fungsionalitas dan cakupan data
 - penentuan struktur teknis
- Tools dan teknik utama:
 - analisis produk
 - identifikasi alternatif pendekatan kerja
 - memahami & menganalisis **kebutuhan stakeholder**
 - penggunaan **expert judgement**
- Aktivitas:
 - review **project charter**
 - **Measurable Organizational Value (MOV)**
MOV harus:
 - terukur
 - memberikan nilai pada suatu organisasi
 - disepakati bersama
 - dapat diverifikasi

Contoh MOV

“Our goal is to land a man on the moon and return him safely by the end of the decade” (John F. Kennedy, 1960)

Ini adalah contoh dari **goal** yang **jelas** dan **terukur**

- Manusia harus mendarat di bulan — bukan pesawat ruang angkasa tak berawak atau pesawat ruang angkasa dengan simpanse.
- Kegiatan ini tidak akan hanya membawa manusia ke bulan atau membuat orang itu kembali setengah jalan.
- Orang ini harus melakukan seluruh perjalanan dan kembali dengan selamat.
- Semua kegiatan ini akan dilakukan sebelum tahun 1970.



- **Deliverable Definition Table (DDT)**: untuk mengkomunikasikan project deliverable
Kolom DDT dapat berupa:
 - nama deliverable
 - struktur/bentuk


- standar yang digunakan
- pihak yang berhak untuk melakukan approval
- sumber daya yang dibutuhkan

Table 5.2 Deliverable Definition Table

Deliverable	Structure	Standards	Approval Needed By	Resources Required
Business case	Document	As defined in the project methodology	Project sponsor	Business case team & office automation (OA) tools
Project charter & project plan	Document	As defined in the project methodology	Project sponsor	Project manager, project sponsor, & OA tools
Technology & organizational assessment	Document	As defined in the project methodology	Project manager & project sponsor	Bank's systems analysts users, case tool, and OA tools
Requirements definition	Document	As defined in the project methodology	Project manager	System analyst, users, case tool, & OA tools
User interface	Prototype	As defined in the user interface guidelines	Project sponsor	System analyst, programmer, users, & integrated development environment (IDE)
Physical & technical design	Document	As defined in the project methodology	Project manager & project sponsor	System analyst, programmer, & case tool
Application system	Files & database	As defined in the project methodology	Project sponsor	Programmers, system analysts, network specialists, program development tools, and relational database management system

Contoh DDT

○ Deliverable Structure Chart (DSC)

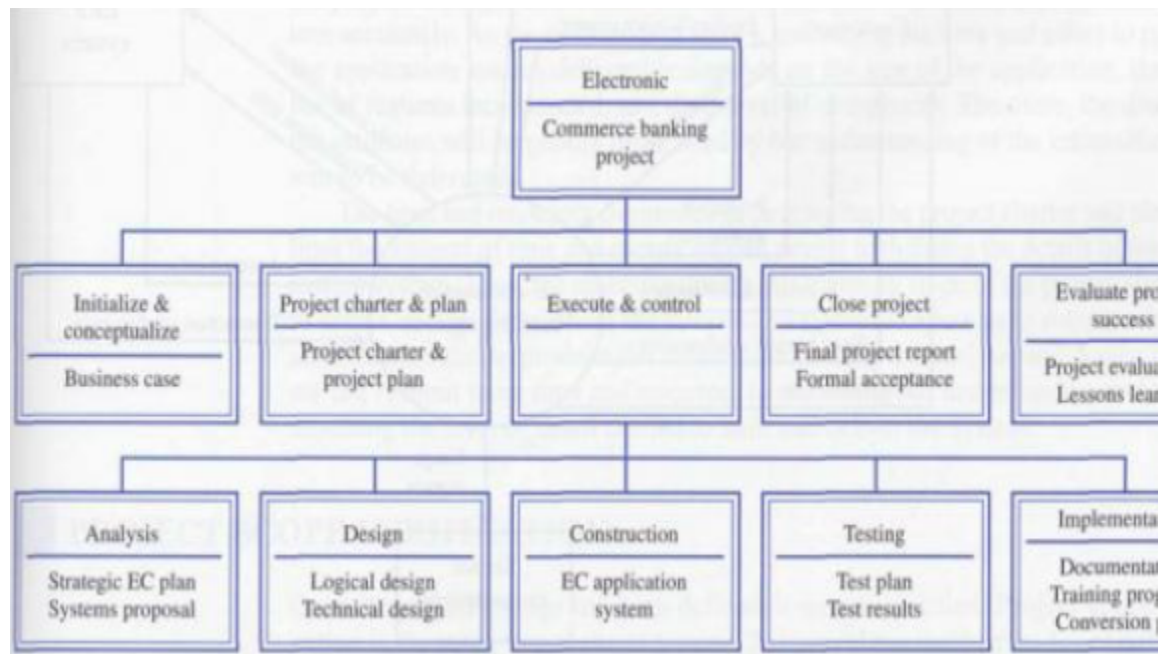

- **Output:** scope statement, permintaan perubahan, perbaikan dari Project Scope Management Plan

4. Create WBS

- Membagi aktivitas pelaksanaan proyek menjadi modul-modul atau unit-unit aktivitas yang lebih kecil sehingga mudah dikendalikan (dekomposisi/pembagian deliverable proyek)

- WBS dapat didekomposisi sebagai:
 - project products
 - project phases
 - project management process groups
- Kamus WBS & Scope baseline:
 - Kamus WBS: dokumen yang menjelaskan keterangan detail dari setiap item di WBS
 - Scope baseline: [Project scope statement + WBS + kamus WBS] dan telah disetujui
 - Scope baseline digunakan untuk mengukur performance dari pencapaian goal dari project scope
- **Output:** WBS, Kamus WBS, permintaan perubahan

WBS berbentuk Struktur Pohon dengan dekomposisi berdasarkan Phase

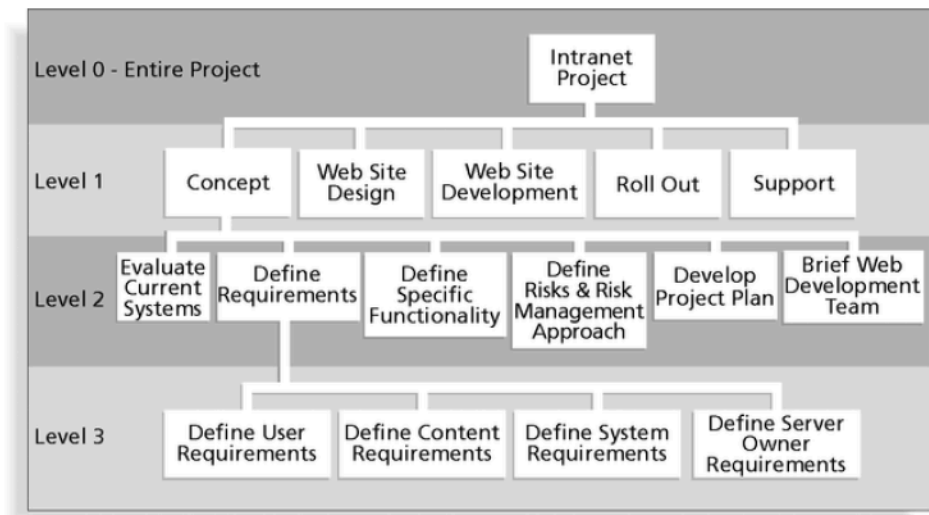


Figure 5-7. Sample Intranet WBS Organized by Phase



1. Website Design

- 1.1 Site Map
- 1.2 Graphic Design
- 1.3 Programs

2. Homepage Design

- 2.1 Text
- 2.2 Images
- 2.3 Hyperlinks

3. Marketing Pages

- 3.1 Text
- 3.2 Images
- 3.3 Hyperlinks

4. Sales Pages

- 4.1 Text
- 4.2 Images
- 4.3 Hyperlinks

Contoh WBS
Proyek Intranet
dalam
project product





1.0 Concept

1.1 Evaluate current systems

1.2 Define Requirements

1.2.1 Define user requirements

1.2.2 Define content requirements

1.2.3 Define system requirements

1.2.4 Define server owner requirements

1.3 Define specific functionality

1.4 Define risks and risk management approach

1.5 Develop project plan

1.6 Brief Web development team

2.0 Web Site Design

3.0 Web Site Development

4.0 Roll Out

5.0 Support

1. Initiating

1.1 Select project manager

1.2 Form project team

1.3 Develop project charter

2. Planning

2.1 Develop scope statement

2.2 Create WBS

2.3 Develop and refine other plan

3. Executing

3.1 Concept

3.2 Website design

3.3 Website development

3.4 Roll Out

3.5 Support

4. Controlling

5. Closing




Contoh WBS Proyek Intranet dalam project phase

Contoh WBS Proyek Intranet dalam project management process groups

Contoh WBS Proyek Intranet dalam project management process groups

1.0 Initiating 1.1 Identify key stakeholders 1.2 Prepare project charter 1.3 Hold project kick-off meeting 2.0 Planning 2.1 Hold team planning meeting 2.2 Prepare team contract 2.3 Prepare scope statement 2.4 Prepare WBS 2.5 Prepare schedule and cost baseline 2.5.1 Determine task resources 2.5.2 Determine task durations 2.5.3 Determine task dependencies 2.5.4 Create draft Gantt chart 2.5.5 Review and finalize Gantt chart 2.6 Identify, discuss, and prioritize risks 3.0 Executing 3.1 Survey 3.2 User inputs	3.3 Intranet site content 3.3.1 Templates and tools 3.3.2 Articles 3.3.3 Links 3.3.4 Ask the Expert 3.3.5 User requests feature 3.4 Intranet site design 3.5 Intranet site construction 3.6 Intranet site testing 3.7 Intranet site promotion 3.8 Intranet site roll-out 3.9 Project benefits measurement 4.0 Monitoring and Controlling 4.1 Progress reports 5.0 Closing 5.1 Prepare final project report 5.2 Prepare final project presentation 5.3 Lessons learned
---	--

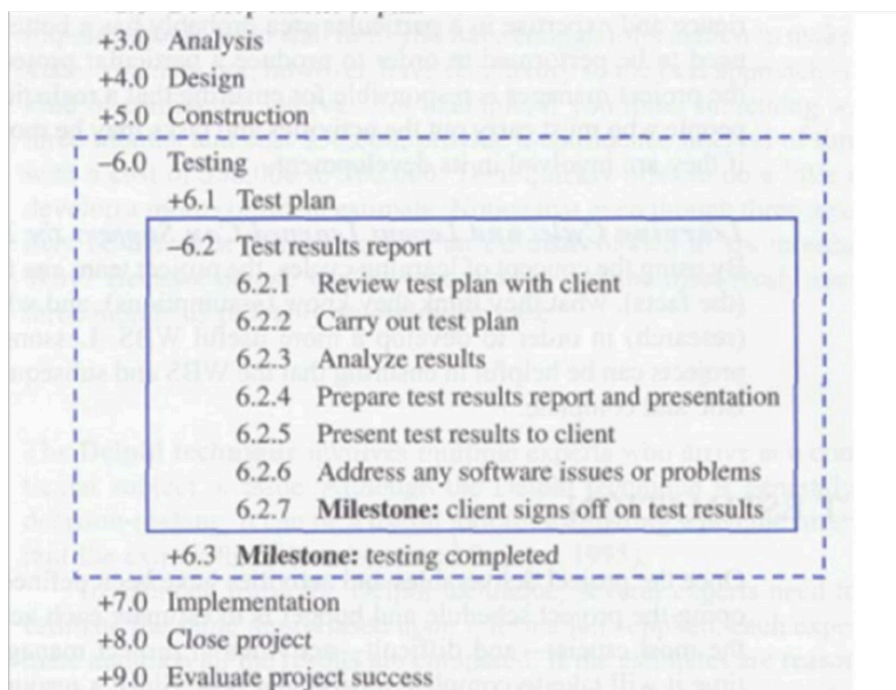

Contoh Work Package dalam WBS

Pendekatan dalam Penyusunan WBS

- Penggunaan guidelines (jika sudah ada)
- Pendekatan analogi (melihat proyek yang sama)
- Pendekatan top-down (mulai dari item global, di-breakdown ke item-item yang lebih kecil)

- Pendekatan bottom-up (identifikasi dari item spesifik lalu disimpulkan dan dibuat terstruktur)
- Pendekatan mind-mapping (menggambarkan cabang-cabang yang menyebar keluar dari core idea)

5. Validate Scope

- Mereview kembali project charter dan preliminary scope statement dan menambahkan informasi baru ketika terjadi perubahan kebutuhan.
- Merupakan **penerimaan formal** scope proyek lengkap oleh **stakeholder**.
- **Input utama:**
 - project scope statement
 - WBS
 - project scope management plan
 - deliverables
- Tool utama: inspeksi, dilakukan oleh customer/sponsor/user
- Verifikasi scope perlu dilakukan untuk **minimisasi** perubahan scope
- **Output:** deliverable yang diterima, permintaan perubahan yang diterima, rekomendasi solusi untuk memperbaiki kesalahan

6. Control Scope

- Mengontrol perubahan scope yang terjadi
- Tujuan:
 - mengarahkan faktor-faktor penyebab perubahan scope
 - menjaga perubahan agar diproses mengikuti prosedur pengembangan sebagai bagian dari pengendalian perubahan
 - mengelola perubahan ketika dilaksanakan
- **Input:**
 - project scope statement
 - project scope management plan
 - WBS & kamus WBS
 - performance report
 - informasi tentang work performance
 - permintaan perubahan yang telah disetujui
- **Output:** WBS, perubahan yang diminta, aksi perbaikan yang direkomendasikan, perbaikan project scope statement
