

WI2022 Manajemen Proyek

Project Communication Management

[Pentingnya Komunikasi yang Baik](#)

[Proses Utama](#)

[Kunci Komunikasi yang Baik](#)

[Communication Management Plan](#)

[Contoh Analisis Komunikasi untuk Stakeholder](#)

[Contoh Matriks Rencana Komunikasi](#)

[Project Communication Management](#)

[Distribusi Informasi](#)

[Teknologi untuk Meningkatkan Distribusi Informasi](#)

[Metode Komunikasi dan Media yang Sesuai](#)

[Media Choice Table](#)

[Contoh Strategi Pemilihan Media Komunikasi](#)

[Reporting Performance](#)

[Mengontrol Komunikasi](#)

[Saran untuk meningkatkan Komunikasi Proyek](#)

[Penggunaan Communication Skills untuk Menangani Konflik](#)

[Guideline Menjalankan Meeting yang Efektif](#)


[Contoh template deskripsi proyek & template monthly progress report](#)

[Menggunakan Software untuk Membantu Komunikasi Proyek](#)

Pentingnya Komunikasi yang Baik

- Kegagalan berkomunikasi adalah ancaman terbesar bagi banyak proyek
- Budaya pada umumnya profesional TI tidak menggambarkan sebagai komunikator yang baik
- Penelitian menunjukkan bahwa para profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk keberhasilan posisi mereka
- Keterampilan verbal yang kuat merupakan faktor kunci dalam kemajuan karir
- Organisasi mencari pekerja dengan perpaduan keterampilan teknis, soft skills, dan business skills.
- Non-technical skills yang paling penting adalah:
 - problem solving,
 - team work,
 - listening,
 - kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan bahasa baru,
 - time management,
 - kemampuan untuk mengubah ilmu/ knowledge ke aplikasi/implementasi,
 - multitasking,
 - verbal communication,
 - kemampuan untuk memvisualisasikan dan membuat konsep,
 - menjadi mentalitas customer,
 - interpersonal skills,
 - memahami budaya bisnis,
 - komunikasi antar tim, dan
 - memberi dan menerima kritik konstruktif
- "Kebutuhan akan keterampilan non-teknis ini sangat besar sehingga beberapa perusahaan IT menunjukkan bahwa mereka akan mempekerjakan individu dengan technical skills yang minimum selama mereka menunjukkan soft skills dan business skills yang kuat."

Proses Utama

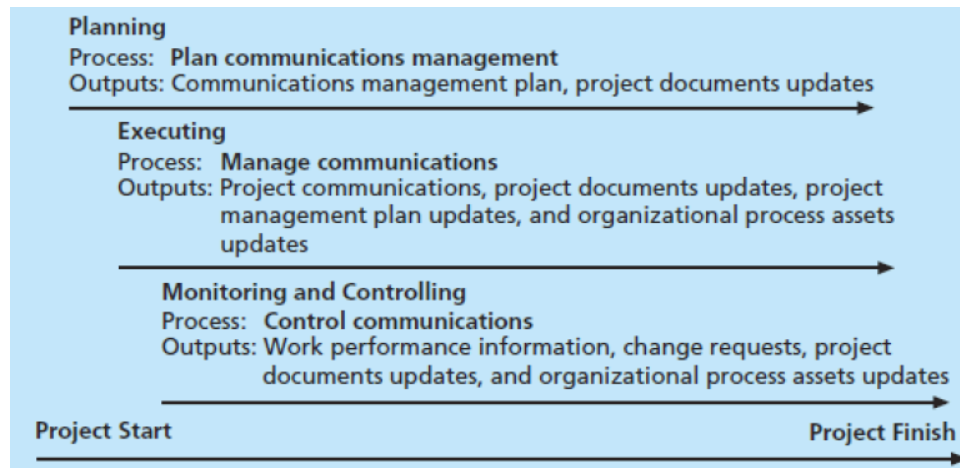

1. **Planning communications** → melibatkan penentuan kebutuhan informasi dan komunikasi dari stakeholders
 - a. Siapa yang butuh informasi apa?
Kapan mereka membutuhkannya?
Bagaimana informasi akan diberikan kepada mereka?
 - b. **Output:** a communications management plan and project documents updates
2. **Mengelola komunikasi** → meliputi membuat, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan menyelesaikan komunikasi proyek berdasarkan communication management plan
 - a. **Output:** project communications, update project documents, update project management plan, dan update Organizational process assets
 - b. Organizational process assets termasuk rencana formal dan informal, kebijakan, prosedur, pedoman, sistem informasi, sistem keuangan, sistem manajemen, lessons learned, dan informasi historis
 - c. Aset-aset ini membantu untuk memahami, mengikuti, dan meningkatkan proses bisnis dalam suatu organisasi
3. **Mengontrol komunikasi** → melibatkan pemantauan dan pengendalian komunikasi proyek untuk memastikan bahwa kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan terpenuhi

Kunci Komunikasi yang Baik

- **Fokus pada kebutuhan komunikasi kelompok dan individu** → depends on ciri kepribadian, lokasi geografis, dan latar belakang budaya

- **Metode formal dan informal untuk berkomunikasi** → informasi dapat diketahui dengan membaca laporan, dari komunikasi informal, atau pertemuan tatap muka
- **Mendistribusikan informasi penting untuk dilakukan dengan cara yang efektif dan tepat waktu**
- **Mengatur cara mengkomunikasikan bad news** → penting untuk menempatkan informasi dalam konteks
- **Menentukan jumlah communication channels** → kompleksitas komunikasi dipengaruhi oleh banyaknya salurang/jalur komunikasi

$$\#communication\ channels = \frac{n(n-1)}{2}$$

Communication Management Plan

→ dokumen untuk memandu komunikasi proyek

→ berisi:

- Kebutuhan komunikasi stakeholder
- Informasi yg dikomunikasikan (format, isi, kerincian)
- Penerima & pembuat informasi
- Metode & teknik mengalirkan informasi
- Frekuensi komunikasi
- Perbaikan prosedur untuk menyelesaikan isu
- Perbaikan prosedur untuk update communication management plan
- Glosary teknologi secara umum

Contoh Analisis Komunikasi untuk Stakeholder

stakeholder	dokumen	format	PIC	waktu
Customer manager	Monthly status report	Hard copy	A	Awal bulan
Customer business staff	Monthly status report	Hard copy	B	Awal bulan
Customer technical staff	Monthly status report	E-mail	C	Awal bulan
Internal management	Monthly status report	Hard copy	D	Awal bulan
Internal business & technical staff	Monthly status report	Intranet	E	Awal bulan
Training subcontractor	Training plan	Hard copy	F	7-3-2006
Software subcontractor	Software implem plan	E-mail	G	3-3-2006

Contoh Matriks Rencana Komunikasi

Pemangku Kepentingan	Tujuan Komunikasi	Pesan Kunci (Informasi)	Metode/Saluran	Frekuensi
Investor/Mitra	Menjaga kepercayaan & transparansi	Update keuangan & pencapaian target	Pertemuan tatap muka, Laporan tertulis	Bulanan
Pemerintah/Regulator	Kepatuhan hukum	Laporan kepatuhan & izin	Surat resmi, Email, Pertemuan rutin	Kuartal
Masyarakat Lokal	Membangun hubungan baik & dukungan	Dampak proyek, Peluang kerja, CSR	Sosialisasi, Rapat warga, Sosial media	Sesuai kebutuhan/Bulanan
Karyawan/Tim Internal	Menyelaraskan tujuan	Update kebijakan, Progres proyek	Email internal, Briefing, Intranet	Mingguan

Project Communication Management

Distribusi Informasi

- Menyampaikan informasi kepada orang yg tepat, pada waktu yg tepat, dalam format yg sesuai
- Penggunaan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi
- Metoda formal dan informal utk distribusi informasi
- Pendistribusian informasi penting dgn cara efektif dan tepat
- Pemilihan media komunikasi yg tepat
- Memahami kebutuhan komunikasi individu & grup

Teknologi untuk Meningkatkan Distribusi Informasi

- Teknologi dapat memfasilitasi proses menciptakan dan mendistribusikan informasi, bila digunakan secara efektif.
 - e-mail, instant messaging, websites, telephones, cell phones, texting, Whatsapp, Line, Facebook, teknologi lainnya untuk berkomunikasi.
- Menggunakan sistem informasi manajemen proyek, dapat membuat dan mengatur dokumen proyek, jadwal, notulen rapat, dan permintaan pelanggan, dan membuatnya tersedia dalam format elektronik.
 - Dapat menyimpan informasi ini secara lokal atau di cloud.
 - Menyimpan template dan contoh dokumen proyek secara elektronik dapat mengakses formulir standar lebih mudah, sehingga membuat distribusi informasi lebih mudah.

- Penting juga untuk memiliki prosedur backup jika terjadi kesalahan dengan teknologi komunikasi normal, seperti yang dijelaskan dalam fitur "Masalah Global" berikut.
 - Dua pertimbangan penting dalam memutuskan teknologi mana yang akan digunakan termasuk metode komunikasi dan media

Metode Komunikasi dan Media yang Sesuai

Tiga klasifikasi metode informasi:

1. Interactive communication

- Dua atau lebih orang berinteraksi untuk bertukar informasi melalui rapat, panggilan telepon, atau video conferencing
- Metode ini biasanya paling efektif untuk memastikan pemahaman umum

2. Push communication

- Informasi dikirim atau dipush ke penerima tanpa permintaan mereka melalui laporan, email, faks, voice mail, dan cara lain.
- Metode ini memastikan bahwa informasi didistribusikan, tetapi tidak memastikan bahwa informasi itu diterima atau dipahami.

3. Pull communication

- Informasi dikirim ke penerima atas permintaan mereka melalui websites, bulletin boards, e-learning, knowledge repositories seperti blogs dan wikis, dan cara lain.

Media Choice Table

	Hard copy	Phone call	Voice mail	E-mail	Meeting	Web site
Menilai komitmen	3	2	3	3	1	3
Membuat konsensus	3	2	3	3	1	3
Media penyelesaian konflik	3	2	3	3	1	3
Menyelesaikan kesalahpahaman	3	1	3	3	2	3
Memberikan apresiasi/dukungan	1	2	2	1	2	3
Mendorong pemikiran kreatif	2	3	3	1	3	3
Menjaga kerahasiaan	2	1	2	3	1	3
Menyalurkan informasi sederhana	3	1	1	1	2	3
Menyampaikan ke banyak orang	2	3	2	2	3	1

Contoh Strategi Pemilihan Media Komunikasi

Media Komunikasi	Tujuan/Fungsi	Khalayak Sasaran	Karakteristik Pesan	Kelebihan	Kelemahan
Media Sosial (IG/TikTok)	Awareness, Edukasi	Muda, Urban, Umum	Visual, Cepat, Ringan	Jangkauan luas, engagement tinggi	Pesan cepat tenggelam, butuh konten terus-menerus.
WhatsApp/Telegram	Koordinasi, Fast Response	Internal, Klien Khusus	Mendesak, Personal	Langsung, interaktif, personal	Rentan spam, kurang formal.
Email Marketing	Informasi Detail, Nurturing	Klien, Pelanggan	Formal, Detil, Personal	Terukur, personal, profesional	Risiko masuk spam, open rate rendah.
Website/Blog	Edukasi Mendalam, SEO	Pencari Informasi	Informatif, Edukatif	Kredibilitas tinggi, tahan lama	Butuh waktu optimasi, traffic organik.
Rilis Berita/Media Masa	Brand Image, Publikasi	Publik Luas, Stakeholder	Formal, Krusial	Kredibilitas tinggi, jangkauan masif	Biaya tinggi, tidak bisa real-time.
Event/Webinar	Engagement, Edukasi	Target Tersegmentasi	Interaktif, Dua arah	Engagement tinggi, networking	Biaya & persiapan tinggi.

Reporting Performance

- Menjaga agar stakeholder mengetahui penggunaan resource dalam mencapai tujuan proyek
- Meliputi Performance Report dan Forecasts
- Performance Report terdiri dari:
 - Status Reports: status proyek pada waktu tertentu
 - Progress Reports: apa yg telah dicapai selama periode tertentu
- Forecasts: memprediksi status proyek kedepan yg didasarkan pada informasi yg lalu & tren

Mengontrol Komunikasi

- Tujuan utamanya adalah untuk memastikan aliran informasi yang optimal di seluruh project life cycle
- Input utama adalah project management plan, project communications, issue logs, work performance data, dan organizational process assets
- Jika ada masalah komunikasi, manajer proyek dan tim perlu mengambil tindakan, yang sering membutuhkan perubahan pada proses awal perencanaan dan pengelolaan komunikasi proyek
- Seringkali bermanfaat untuk memiliki seorang fasilitator dari luar tim proyek untuk menilai seberapa baik komunikasi bekerja

Saran untuk meningkatkan Komunikasi Proyek

- Penggunaan communication skills utk menangani konflik
- Membangun communication skills yg lebih baik
- Menjalankan meeting yg efektif
- Penggunaan e-mail secara efektif
- Penggunaan template utk komunikasi proyek
- Membangun infrastruktur komunikasi

Penggunaan Communication Skills untuk Menangani Konflik

Mode dasar penanganan konflik (Blake & Mouton):

- **Confrontation**: pendekatan problem solving yang meminta pihak-pihak terus bekerja sesuai tugas → pihak yang berkonflik bersama-sama mengidentifikasi masalah, berkolaborasi untuk mencari, mempertimbangan, serta memilih solusi alternatif dari permasalahan yang ada
- **Compromise**: pendekatan give & take (bargain) dan mencari solusi yg memberikan beberapa kepuasan → menempatkan seseorang pada posisi moderat, memadukan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain
- **Smoothing**: mengabaikan perbedaan & menekankan kesamaan → menekankan pada persamaan kepentingan dan mengurangi perbedaan di antara pihak-pihak yang berkonflik
- **Forcing**: penyelesaian win-lose → memaksa salah satu pihak untuk mengalah
- **Withdrawal**: mencabut kembali pertentangan potensial → menghindari dari konflik yang sedang terjadi

Guideline Menjalankan Meeting yang Efektif

- Jangan lakukan meeting jika ada cara yg lebih baik
- Tentukan tujuan dan manfaat meeting
- Tetapkan siapa yg akan hadir
- Informasikan agenda sebelum meeting
- Siapkan handout, alat bantu. Logistik, dll
- Jalankan meeting scr profesional. Beri pengantar, jelaskan tujuan, dan aturan-aturan
- Bangun relationship

Contoh template deskripsi proyek & template monthly progress report

Project X Description


Objective: Describe the objective of the project in one or two sentences. Focus on the business benefits of doing the project.

Scope: Briefly describe the scope of the project. What business functions are involved, and what are the main products the project will produce?

Assumptions: Summarize the most critical assumptions for the project.

Cost: Provide the total estimated cost of the project. If desired, list the total cost each year.

Schedule: Provide summary information from the project's Gantt chart, as shown. Focus on summary tasks and milestones.

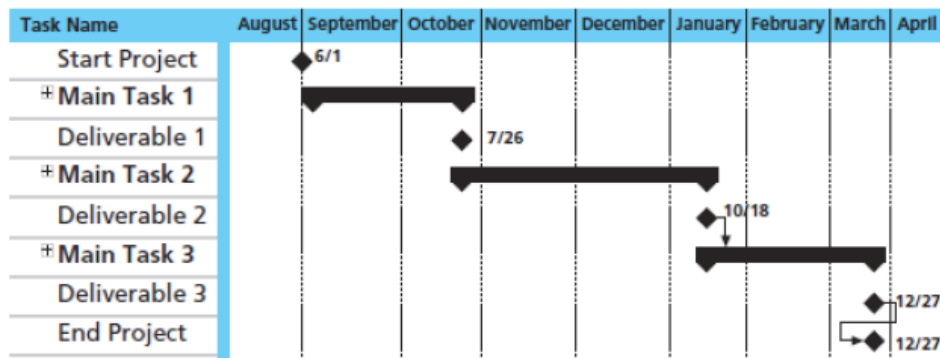

© Cengage Learning 2016

Accomplishments for January (or appropriate month):

- Describe most important accomplishments. Relate them to project's Gantt chart.
- Describe other important accomplishments, one bullet for each. If any issues were resolved from the previous month, list them as accomplishments.

Plans for February (or following month):

- Describe most important items to accomplish in the next month. Again, relate them to project's Gantt chart.
- Describe other important items to accomplish, one bullet for each.

Issues: Briefly list important issues that surfaced or are still important. Managers hate surprises and want to help the project succeed, so be sure to list issues.

Project Changes (Dates and Description): List any approved or requested changes to the project. Include the date of the change and a brief description.

Menggunakan Software untuk Membantu Komunikasi Proyek

- Software untuk Project Management dapat memberikan berbagai view informasi untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi
- Kebanyakan software untuk project management memungkinkan pengguna untuk memasukkan hyperlink ke file-file terkait proyek lainnya
- Manfaatkan teknologi baru dan sesuaikan sistem yang ada untuk melayani kebutuhan komunikasi khusus pelanggan dan tim proyek
 - Instant messaging dan text messaging untuk berkomunikasi secara cepat dengan rekan kerja, customers, suppliers, dan yang lain
 - Webcasts untuk menyajikan video, graphics, sound, voice, dan feedback partisipan langsung melalui web
 - Podcasts dan video YouTube untuk menyediakan berbagai jenis informasi audio dan video
- Software untuk Enterprise project management menyediakan banyak fungsi workgroup yang memungkinkan anggota tim di lokasi yang berbeda dapat bekerja bersama dalam proyek dan berbagi informasi proyek
- Solusi Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) Solution menyediakan tools berikut
 - **Portfolio management:** menyediakan centralized dan consolidated view dari program dan proyek, user dapat mengevaluasi dan memprioritaskan kegiatan di seluruh organisasi.
 - **Resource management:** memaksimalkan human resources sering menjadi kunci untuk meminimalkan biaya proyek
 - **Project collaboration:** Berbagi informasi proyek sering kali merupakan upaya yang serampangan
